



TRAVAUX DE REALISATION DES PIEUX – PHASE 3

Du : lundi 10 au mardi 11/02/2025 : réalisation des pieux D et I

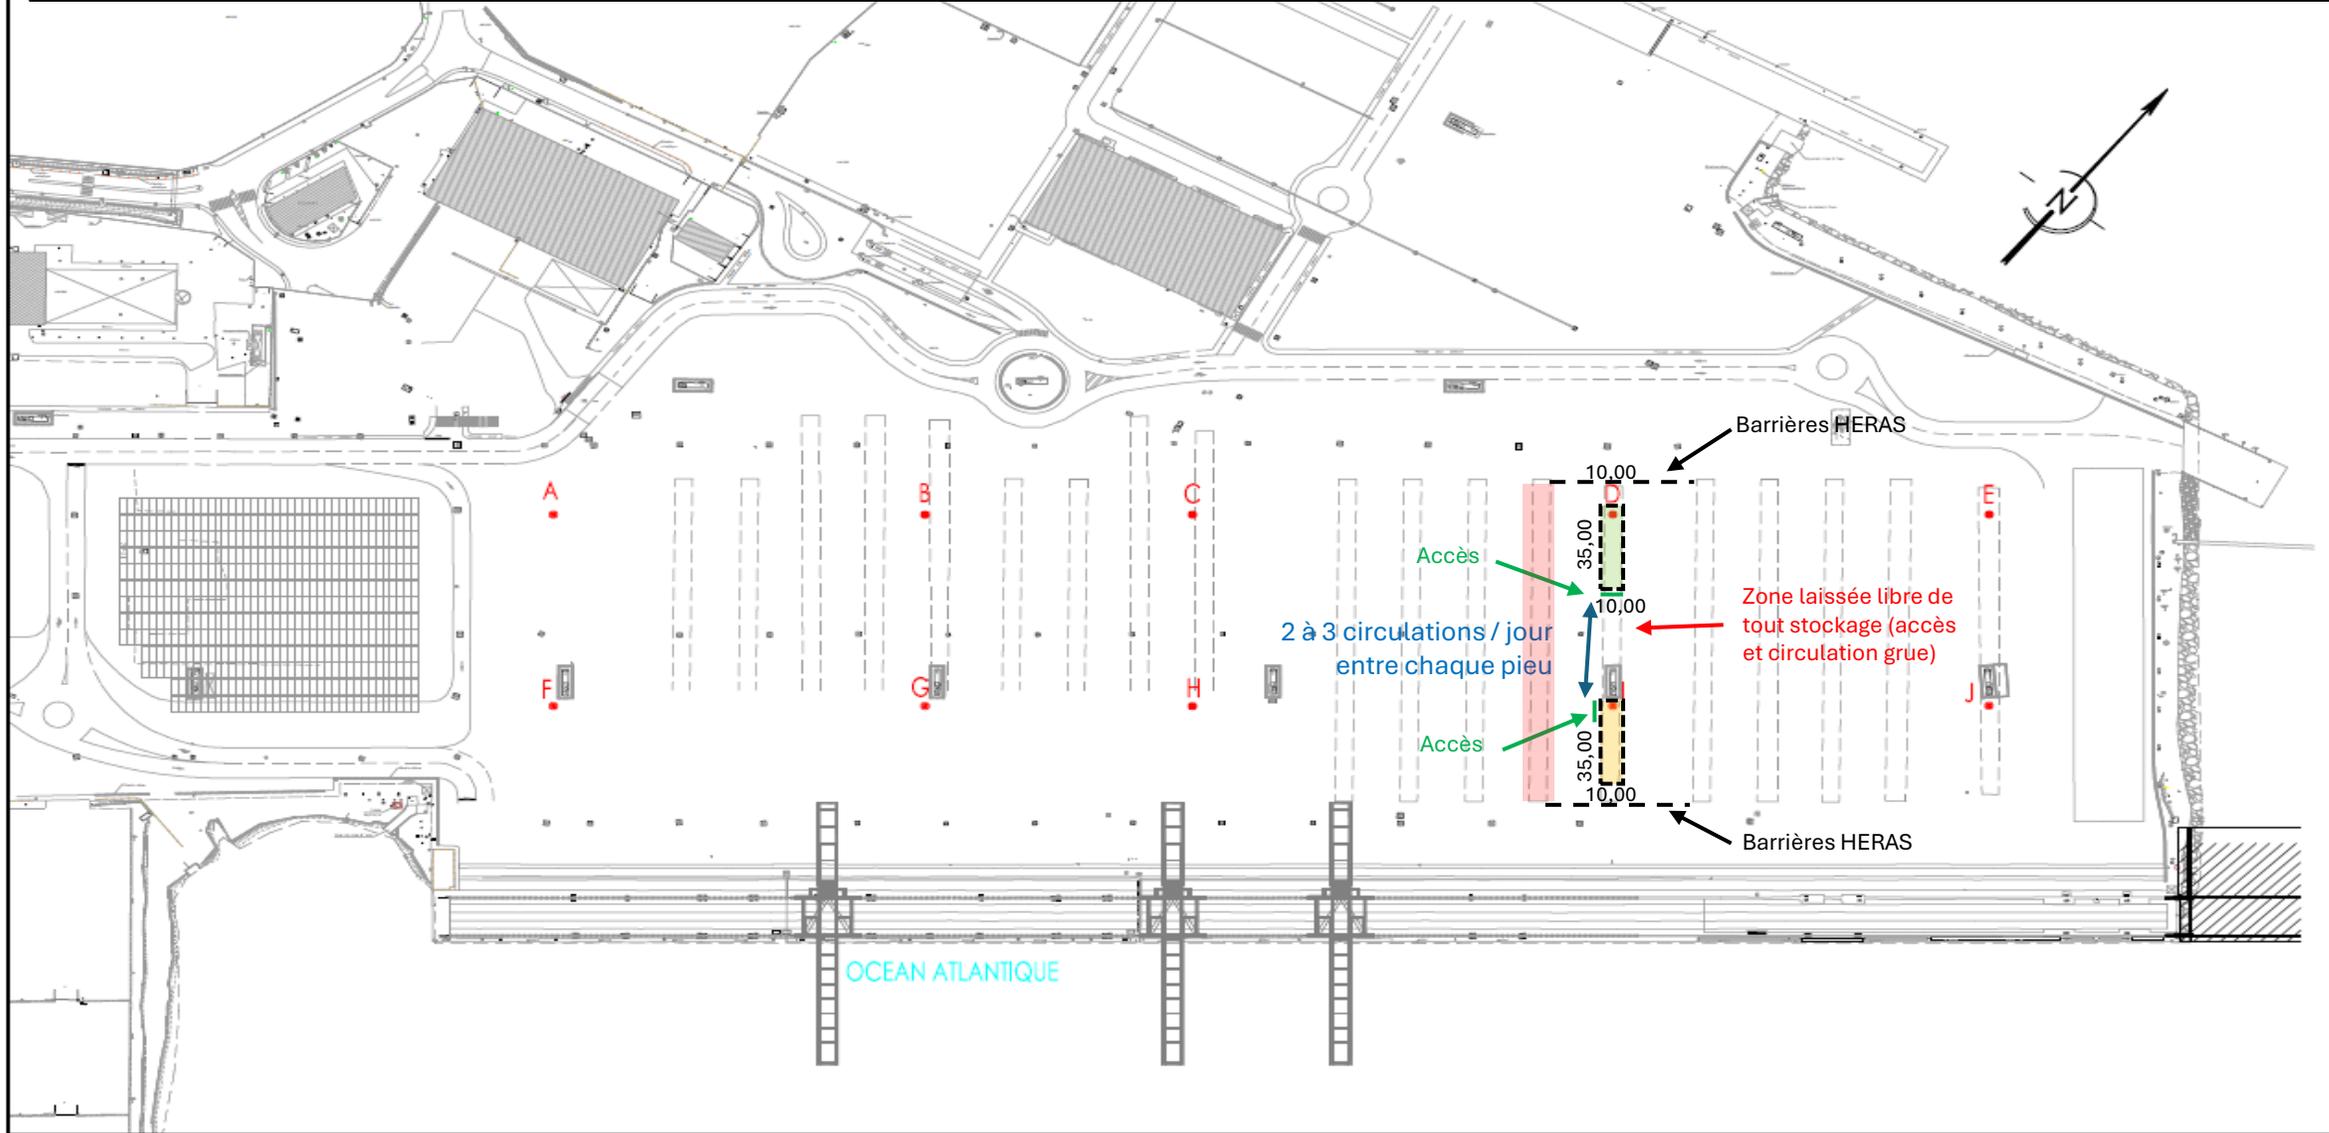


TRAVAUX DE REALISATION DES PIEUX – PHASE 3

Mercredi 12/02/2025 : libération emprise pieu I + mise en place balisage pieu J

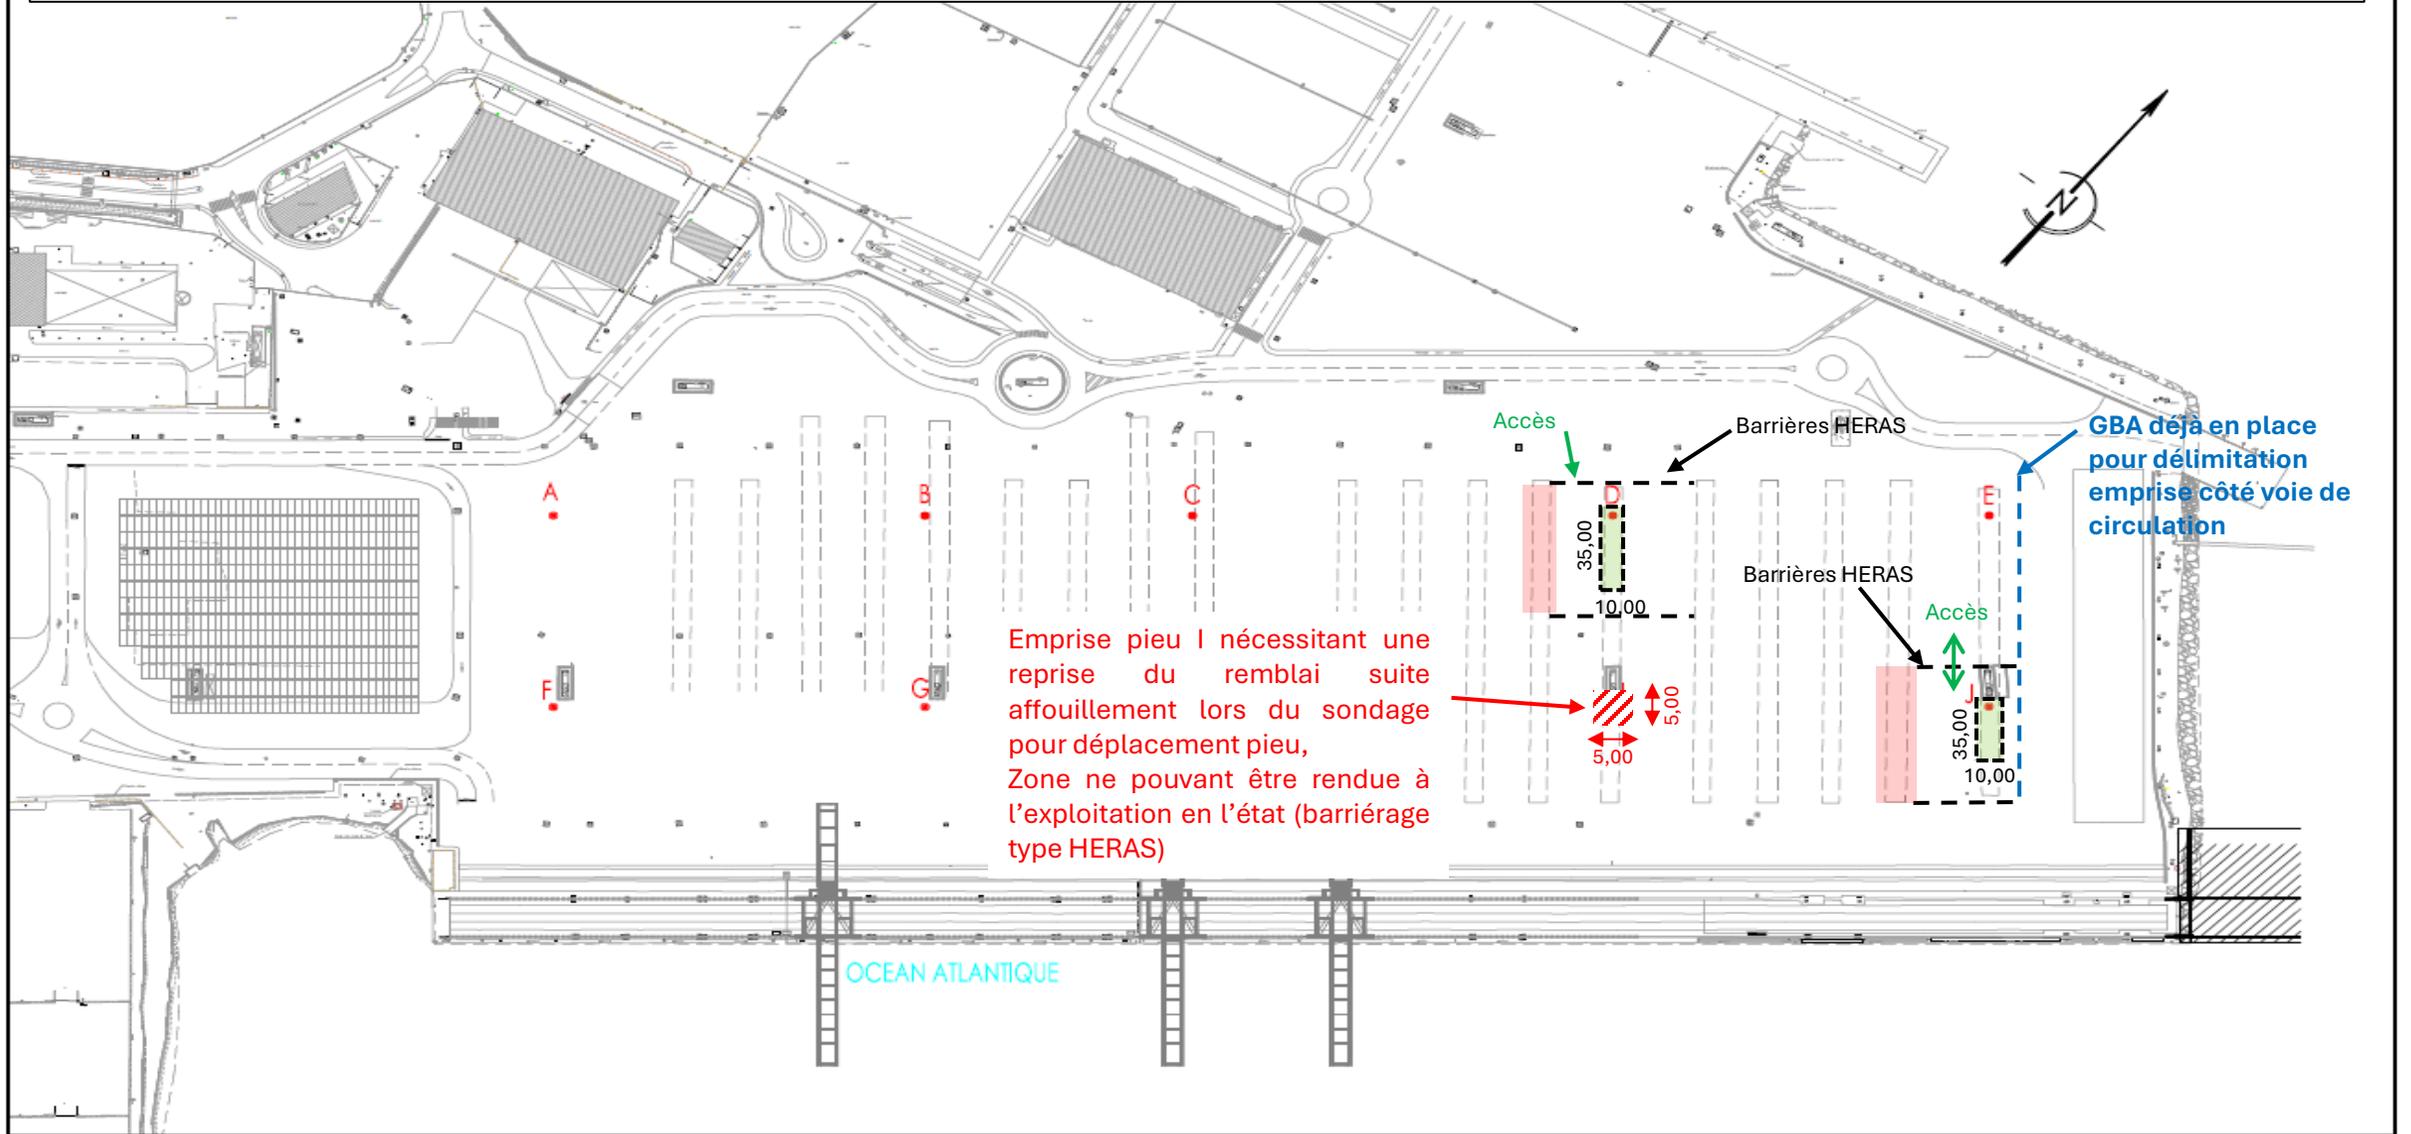

TRAVAUX DE REALISATION DES PIEUX D, I, E & J – PHASE 3


Jeudi 13/02/2025 : libération emprise pieu D + Mise en place balisage pieu E

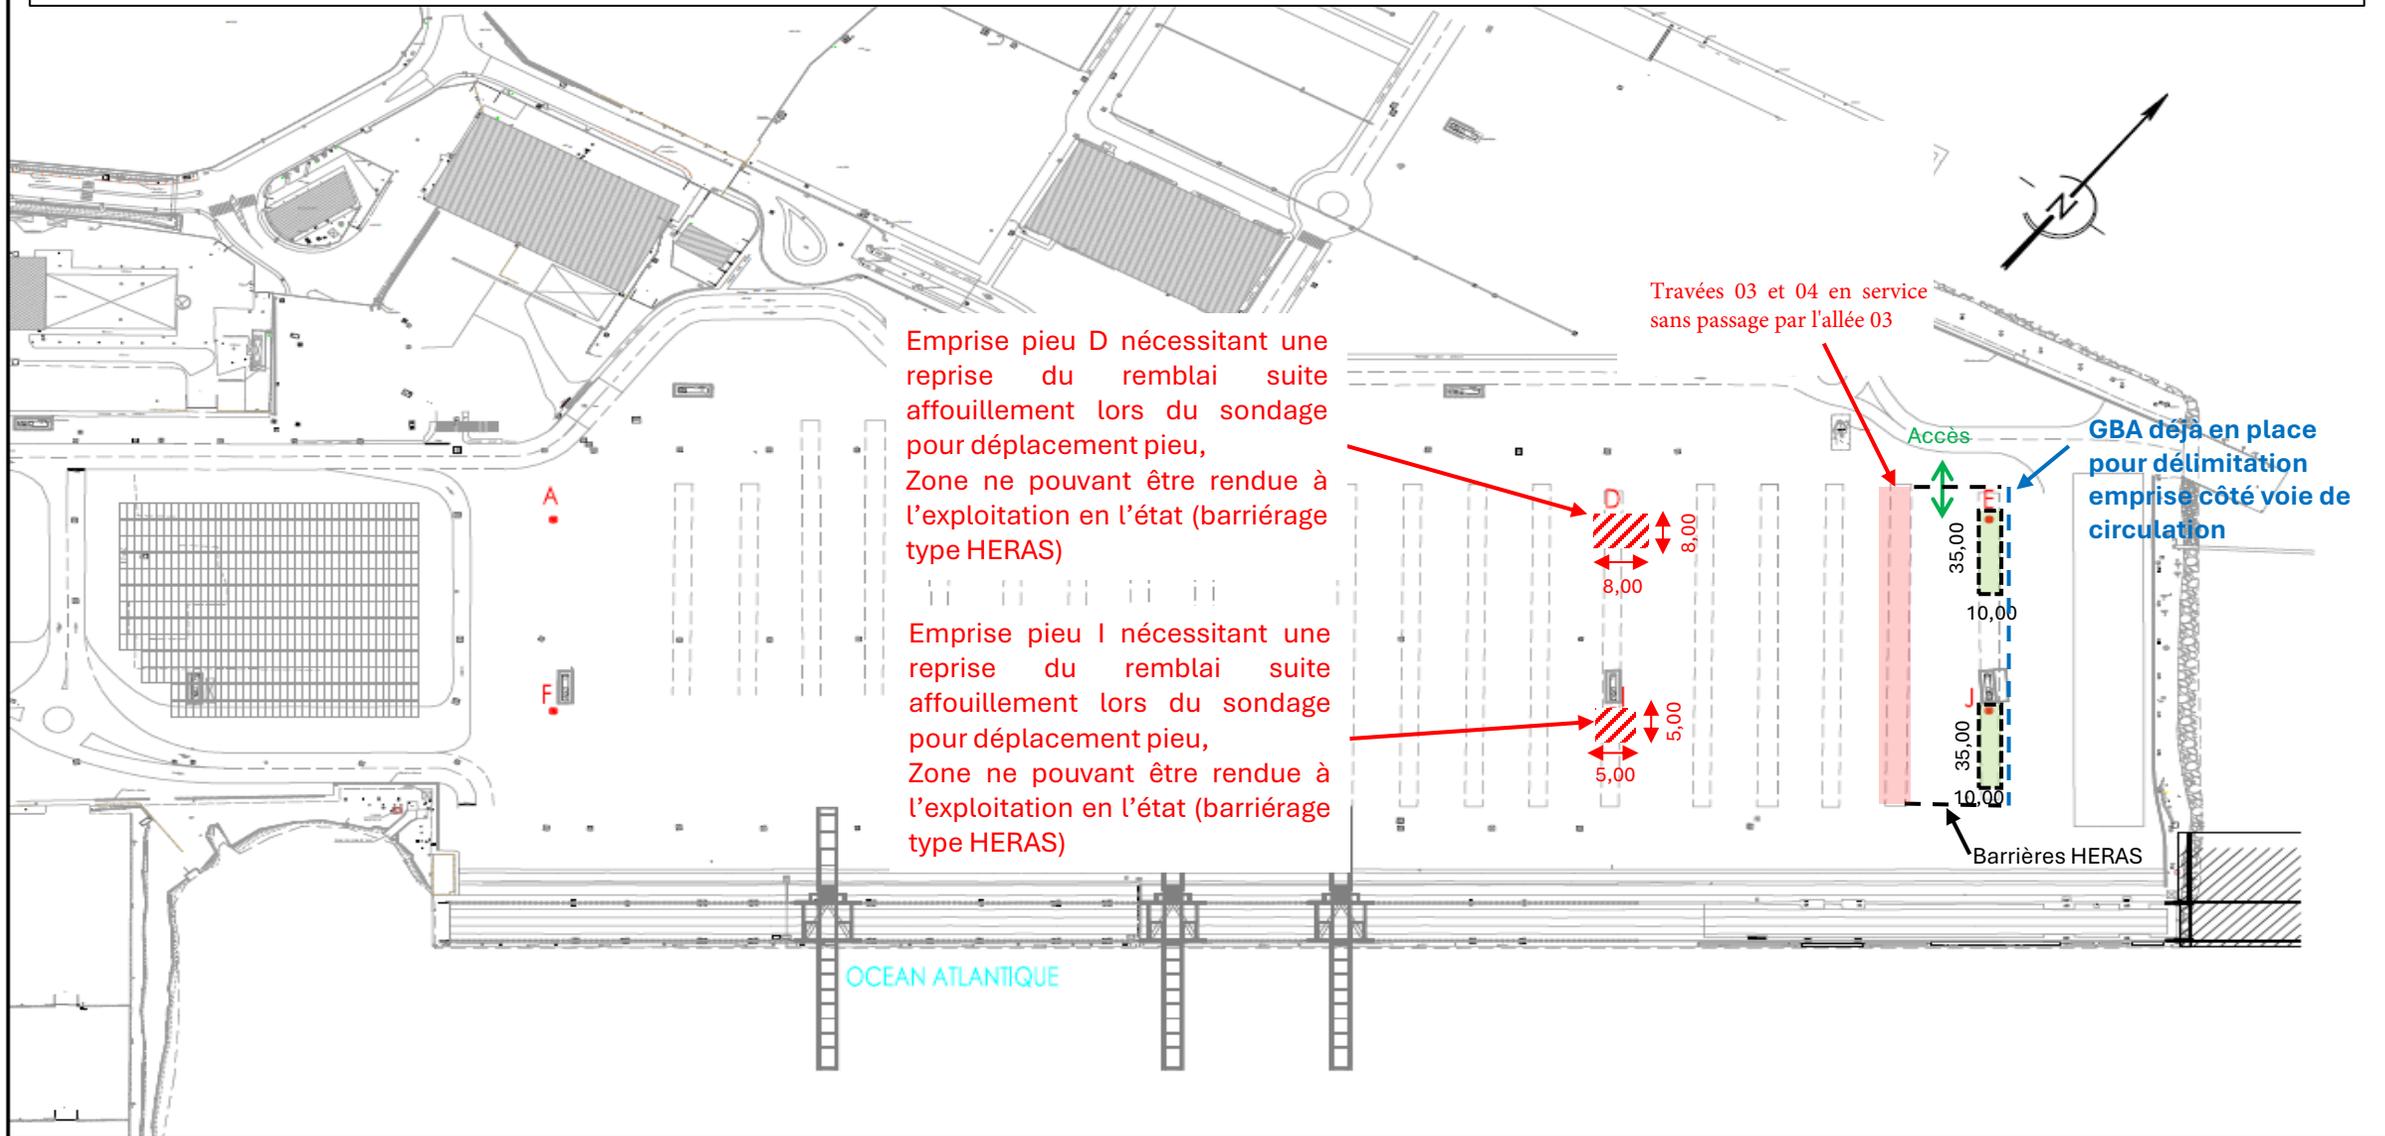

TRAVAUX DE REALISATION DES PIEUX D, I, E & J – PHASE 3


Du vendredi 14 au lundi 24/02/2025 : Travaux de battage des pieux E et J

Remise en état des pieux E et J à l'issue des travaux

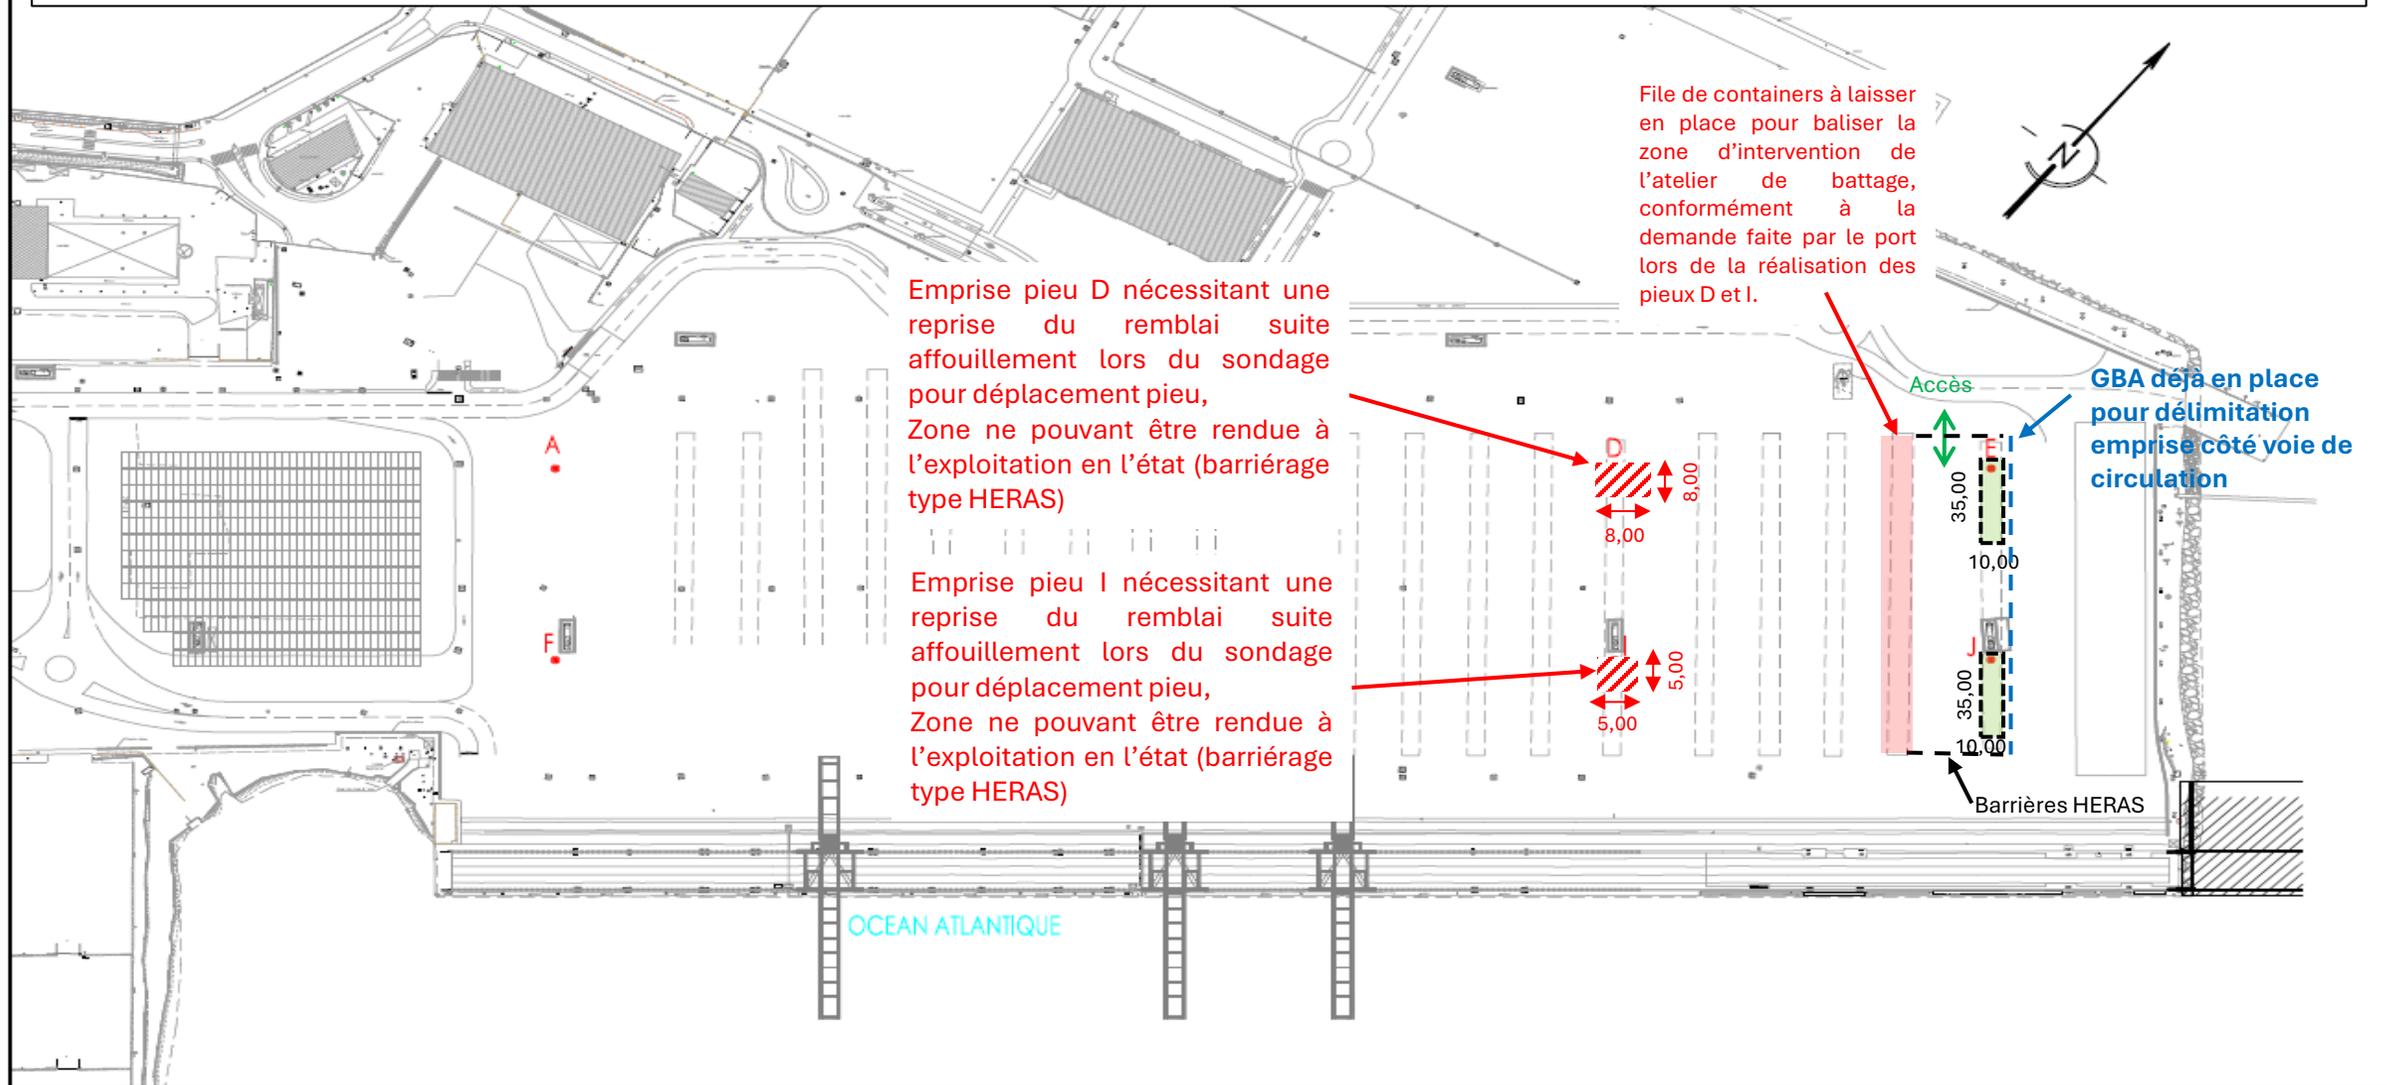

TRAVAUX DE REALISATION DES PIEUX D, I, E & J – PHASE 3

A partir du mardi 25/02/2025 : plateforme de stockage remise en état comme à l'initial

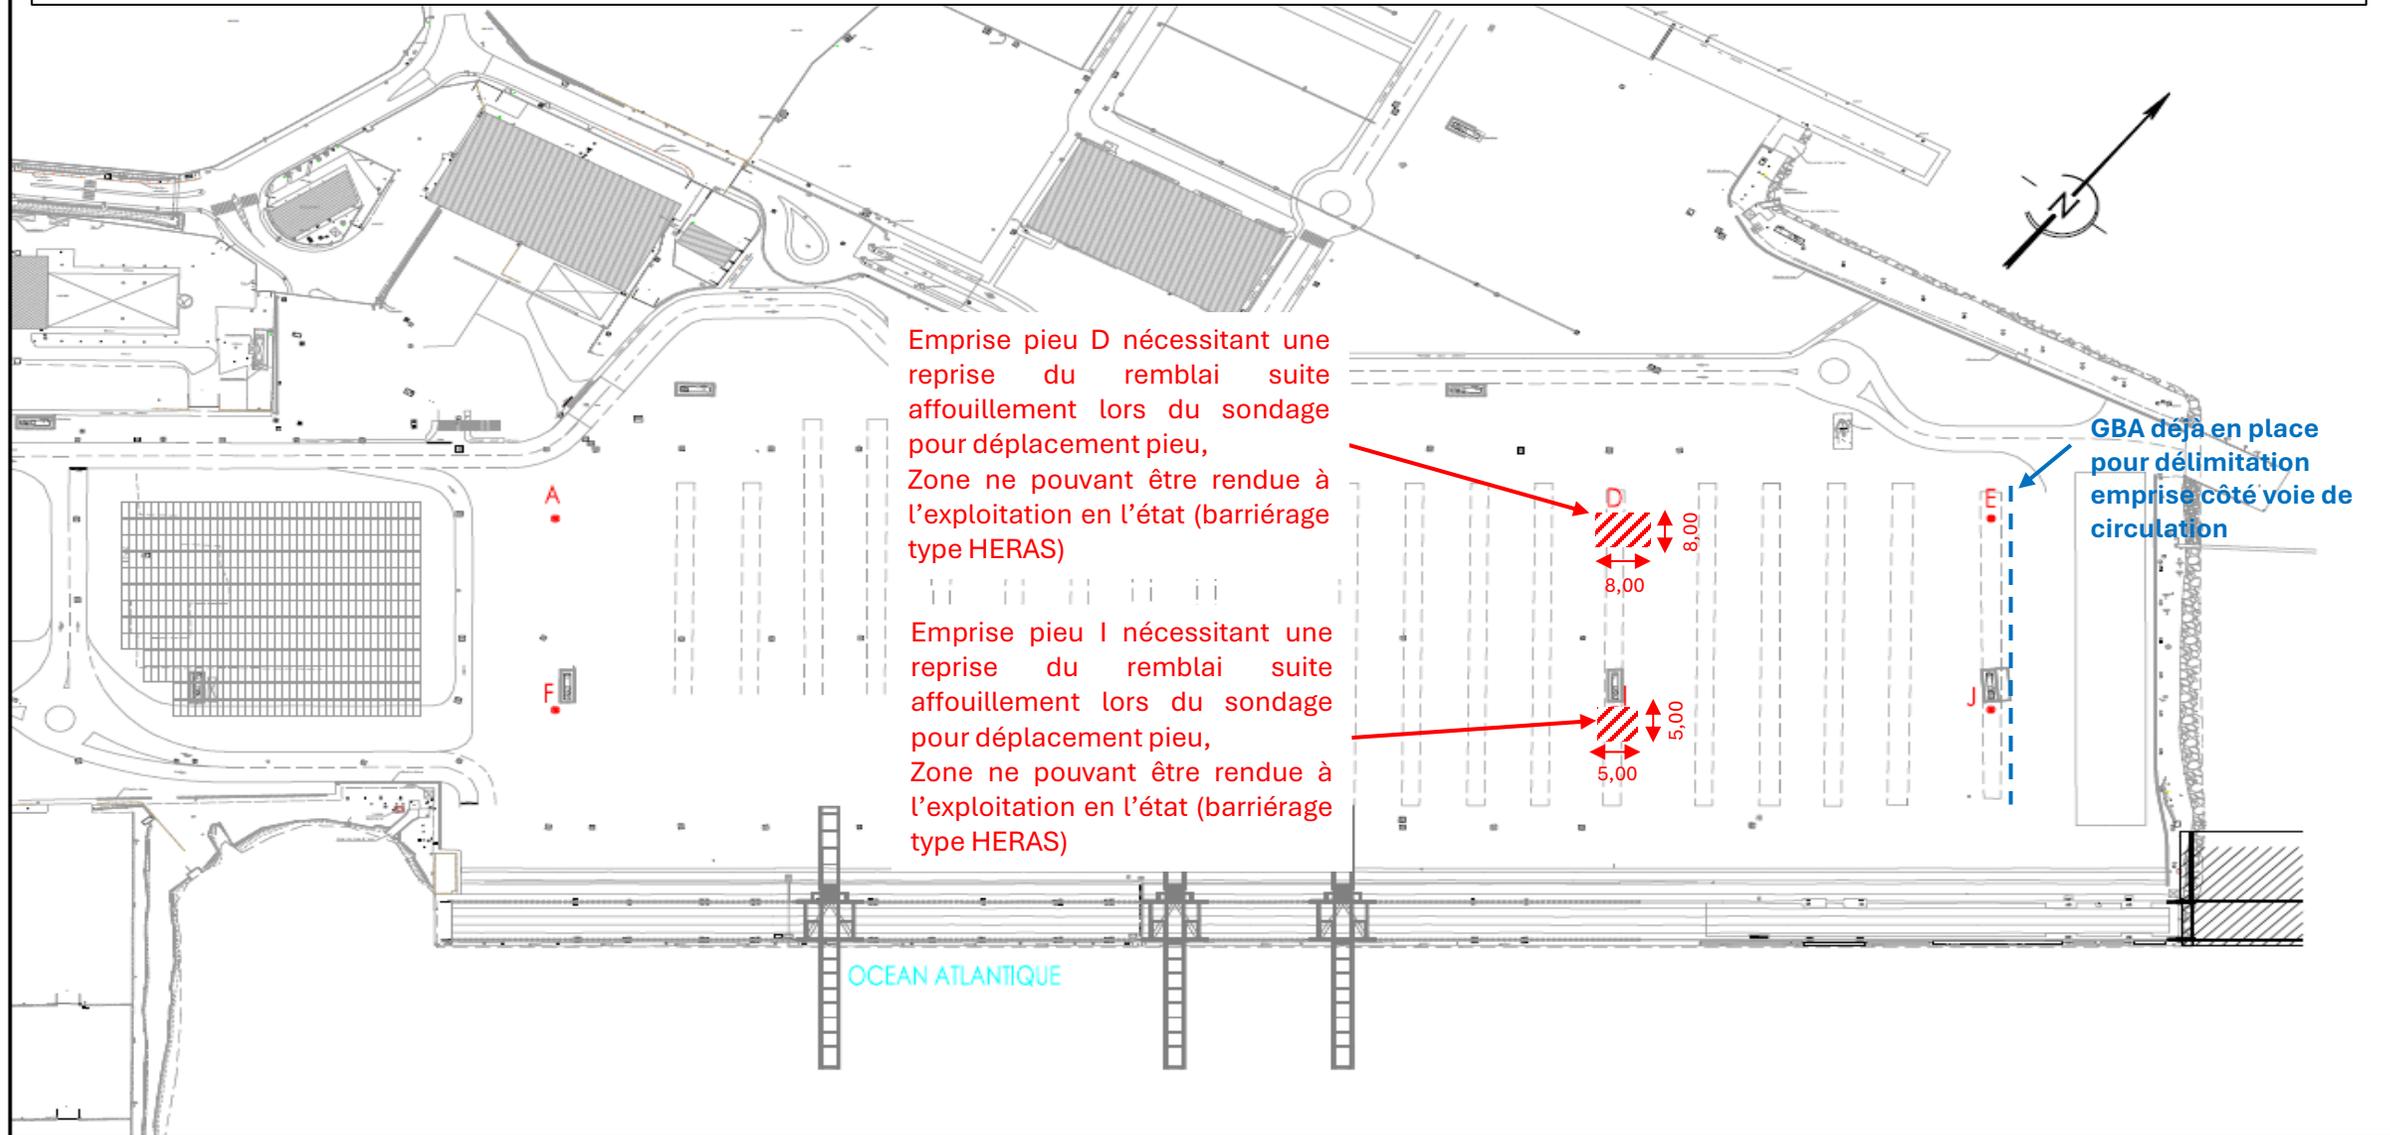

Emprise pieu D nécessitant une reprise du remblai suite affouillement lors du sondage pour déplacement pieu, Zone ne pouvant être rendue à l'exploitation en l'état (barriérage type HERAS)

Emprise pieu I nécessitant une reprise du remblai suite affouillement lors du sondage pour déplacement pieu, Zone ne pouvant être rendue à l'exploitation en l'état (barriérage type HERAS)

GBA déjà en place pour délimitation emprise côté voie de circulation

OCEAN ATLANTIQUE
